

PROTOKOLL NR. 27

Betrifft: Baukommission Riemenstaldnerbach
Konkordat Uri / Schwyz
Datum: 18. November 2015, 14:00 - 16:15 Uhr
Ort: Amt für Tiefbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf

Teilnehmer:

KANTON SCHWYZ

Tiefbauamt

A. Rey, Umweltdepartement, Amt für Wasserbau, Postfach 1214, 6431 Schwyz

Bezirk Schwyz

X. Schelbert, Bezirksrat / Gewässerpräsident Bezirk Schwyz, Hauptstr. 90, 6436 Muotathal

KANTON URI

Amt für Tiefbau

S. Flury, Kantonsingenieur, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf (Präs. BK)

E. Philipp, Abt. Wasserbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf

H. Duss, Abt. Wasserbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf (Protokoll)

Gemeinde Sisikon

B. Fischlin, am See 5, 6452 Sisikon

Gemeinde Riemenstalden

M. Gisler, Baupräsident, Rosslau 2, 6452 Riemenstalden

Entschuldigt:

D. Kassubek, Kantonsingenieur, Tiefbauamt Kt. Schwyz, Postfach 1251, 6431 Schwyz (Vizepräs. BK)

K. von Euw, Bezirk Schwyz, Gewässerkommission, Rathaus, 6430 Schwyz

Verteiler:

Teilnehmer / Entschuldigte

Gemeinderat Sisikon, 6452 Sisikon

Gemeinderat Morschach, 6443 Morschach

G. Schuler, Tiefbauamt Kanton Schwyz, Abt. Abteilung Realisierung, Postfach 1251, 6431 Schwyz

J. Gabriel, Kantonsforstamt, Bahnhofstrasse 9, Postfach 1184, 6431 Schwyz

B. Annen, Amt für Forst und Jagd, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf

F. Epp, Leiter Gewässerunterhalt, Amt für Tiefbau Kt. Uri, Abt. Wasserbau, Klausenstr. 2, 6460 Altdorf

Traktanden:

1. Protokollgenehmigung (Protokoll Nr. 26)
2. Informationen
3. Rutschung Binzenegg
4. Geschiebeentnahmen im Sommer 2015 im Seebecken
5. Bau- und Auflageprojekt Hochwasserschutz Riemenstaldnerbach
6. Jahresprogramm und Jahresbudget 2016
7. Konkordatsvertrag
8. Verschiedenes
9. Weiteres Vorgehen
10. Termine


Abkürzungen

| | |
|--------|---|
| BK | Baukommission Riemenstaldnerbach |
| AWB | Umweltdepartement Schwyz, Amt für Wasserbau |
| KFA | Kantonsforstamt Schwyz |
| BD | Baudirektion / Baudepartement |
| AfT | Amt für Tiefbau (Kanton Uri) |
| AFJ | Amt für Forst und Jagd (Kanton Uri) |
| ARE | Amt für Raumentwicklung (Kanton Uri) |
| BAFU | Bundesamt für Umwelt, Bern |
| IB | Interessenbeitrag |
| HWS | Hochwasserschutz |
| bbD | besonders bevorteilte Dritte |
| KBG | Korporationsbürgergemeinde |
| GIS | Geographisches Informationssystem |
| TK HWS | Technische Kommission Hochwasserschutz |

| | Erledigung Wer / Termine |
|---|-----------------------------|
| <p>1. Protokollgenehmigung (Protokoll Nr. 26)</p> <p>Das Protokoll Nr. 26 der BK- Sitzung vom 19. November 2014 wird verdankt und genehmigt.</p> <p>Pendenzenliste Die Pendenzenliste wurde aktualisiert (s. Beilage).</p> <p>2. Information</p> <p>2.1 Kostenteiler Ernst Philipp informiert über den Stand der Kostenteilerverhandlungen im Kanton Uri. Das BAFU erarbeitete ein risikobasiertes Modell mit einem risikobasierten Anteil und einem Werkeigentümerpflichtanteil. Neu</p> | |

| | Erledigung Wer / Termine |
|--|--|
| <p>ist, dass jedes einzelne Projekt verhandelt werden muss. Als erstes Projekt wurde der Kostenteiler für den Schipfenbach in der Gemeinde Silenen auf der Grundlage des Modells erarbeitet. Die Kostenteilerverhandlungen für das Bauprojekt Riemenstaldnerbach (s. Traktandum 5) werden in Kürze gestartet.</p> <p>2.2 Wasserrechtsgesetz SZ und Gewässerunterhalt Alois Rey informiert über den Stand der Arbeiten. Die Totalrevision des Wasserrechtsgesetzes ist im Gange und bezüglich Gesetzestext im Entwurf ausgearbeitet. Der Ablauf bis Inkraftsetzung dürfte jedoch noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Vom System der Wuhrkorporationen wird man sich aus rechtlichen Gründen verabschieden müssen. Der Terminplan sieht wie folgt aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016: Vernehmlassung - 2017: Kantonsrat - 2018: Inkraftsetzung <p>Mit dem neuen Wasserrechtsgesetz wäre dann der Unterhalt geregelt und damit würden keine separaten Vereinbarungen benötigt.</p> <p>3. Rutschung Binzenegg (Messergebnisse, Fortsetzung der Überwachung) Die Überwachung der Rutschung Binzenegg erfolgt einmal jährlich durch die Firma Flotron. Die Messung Nr. 15 wurde am 13. Mai 2015 durchgeführt. Es wurden keine signifikanten Verschiebungen festgestellt. Die nächste Messung erfolgt im Frühjahr 2016. Die aufgelaufenen Kosten für die Überwachung der Rutschung Binzenegg sind per Ende 2015 abzurechnen. Danach erfolgt die Abrechnung über das Grundangebot (neue Pos.-Nr. eröffnen).</p> <p>4. Geschiebeentnahmen im Sommer 2015 im Seebecken Im Sommer 2015 wurde das Seebecken bis auf Projektsohle geräumt. Der Entscheid der Geschiebeentnahme erfolgte aufgrund der Unterwasservermessung, welche erstmals durchgeführt wurde. Die Entnahmemenge betrug rund 3'400 m³ (s. Beilage).</p> <p>5. Bau- und Auflageprojekt Hochwasserschutz Riemenstaldnerbach Das Hochwasserschutzprojekt wurde am 15. Mai 2015 im Amtsblatt des Kantons Uri publiziert und gemäss Artikel 12 Wasserbaugesetz vom 15. Mai bis 15. Juni öffentlich aufgelegt. Zeitgleich wurde das Bauge-such im Amtsblatt des Kantons Schwyz publiziert und anschliessend für 20 Tage öffentlich aufgelegt. Innert den Fristen sind keine Einsprachen eingegangen. Der Regierungsrat des Kantons Uri genehmigte das Bau- und Auflageprojekt am 30. Juni 2015 und die zuständige Gemeinde Morschach auf Schwyzer Kantonsgebiet erteilte die Baubewilligung am 14. Juli 2015. Die Planung erfolgte integral und koordiniert mit dem Kanton Schwyz, der SBB und dem ASTRA. Die Planung der Überlastmassnahmen auf den Geleisen der SBB im Bereich der Brücke des Riemenstaldnerbachs erfolgte direkt von der SBB.</p> | <p>KFA / D. Bollinger Frühjahr 2016</p> <p>AfT Dezember 2015</p> |

| | Erledigung Wer / Termine |
|---|---|
| <p>Die Kosten inkl. Überlastmassnahmen auf den Geleisen der SBB bei der Bahnbrücke betragen gemäss Kostenvoranschlag Fr. 3'370'000.-. Die Ausführung ist in den Jahre 2016-2018 vorgesehen. Erste Bauarbeiten werden ab Frühjahr 2016 ausgeführt. Die Massnahmen auf den Geleisen der SBB können nach Angaben der SBB frühestens im 2018 erstellt werden. Die Kostenteilerverhandlungen auf der Basis des risikobasierten Kostenteilermodells werden mit dem ASTRA und der SBB demnächst aufgenommen.</p> <p>Beschluss:</p> <p>Die BK-Mitglieder genehmigen das Bau- und Auflageprojekt einstimmig. Das Gesuch um Abgeltung (Subventionsgesuch) ist beim BAFU Ende November 2015 einzureichen.</p> | <p>AfT Januar 2016</p> <p>AfT November 2015</p> |
| <p>6. Jahresprogramm und Jahresbudget 2016</p> <p>Im kommenden Jahr sind die Massnahmen M1, M2, M3 und M7 zur Ausführung vorgesehen (s. Beilage Übersichtsplan). Die Massnahme M7 befindet sich in der Schluchtpartie und die Kosten betragen gemäss Kostenvoranschlag Fr. 300'000.-. Die übrigen Massnahmenmodule M1, M2 und M3 befinden sich im Dorf Sisikon (Unterlauf). Diese Kosten betragen gemäss Kostenvoranschlag Fr. 1'150'000.-. Einschliesslich der Rutschüberwachung Binzenegg ist im Jahr 2016 ein Betrag von total Fr. 1'455'000.- budgetiert.</p> <p>Beschluss:</p> <p>Das Jahresbudget 2016 wird durch die BK-Mitglieder einstimmig genehmigt und ist den Regierungen Uri und Schwyz gleichzeitig zur Genehmigung einzureichen.</p> | <p>AfT / AWB Dezember 2015</p> |
| <p>7. Konkordatsvertrag</p> <p>An der letzten BK-Sitzung stellte Alois Rey die Frage, wie der Massnahmenplan mit dem Konkordatsvertrag verknüpft ist. Nach der Ausführung der Massnahmen könnte sich nämlich die Frage stellen, ob der Konkordatsvertrag aufzulösen ist, da der Massnahmenplan umgesetzt wurde.</p> <p>Gemäss Art. 16 des Konkordatsvertrages gilt das Konkordat bis die Sicherungsmassnahmen vollendet sind. Da in den kommenden Jahren Massnahmen umgesetzt werden, ist zurzeit kein Entscheid nötig.</p> | |
| <p>8. Verschiedenes</p> <p><u>Gefahrenkarte nach Massnahmen</u></p> <p>Im Rahmen des Bauprojekts wurde die Gefahrenkarte nach Massnahmen erarbeitet. Es zeigt sich, dass zwei Wohnhäuser neu ausserhalb der Gefahrenstufe rot mit erheblicher Gefährdung zu liegen kommen. Die Gefahrenkarte ist im Dossier 'Subventionsgesuch BAFU' vom 20. November 2015 enthalten und wird an der Sitzung der Kommission Naturgefahren vom 26. November 2015 besprochen.</p> | <p>AfT 26. Nov. 2015</p> |

| | Erledigung Wer / Termine |
|---|------------------------------------|
| <p><u>Nutzungsverträge der Quellen</u> Die Nutzungsverträge der Quellen sind zu verlängern (s. Beilage Terminliste Dienstbarkeitsverträge mit Quelleneigentümern). Dies ist wichtig, da gemäss Bauprojekt auch Massnahmen in Quellschutzgebieten auszuführen sind. Vorgängig klärt das AfT/WB die Kosten der Vertragsverlängerungen ab und informiert das AWB. Die Verlängerung der Verträge entspricht auch dem Wunsch der Wasserkommission Sisikon. Sie teilte dies mit Schreiben vom 23. Juni 2015 der BK Riemenstaldnerbach mit.</p> <p><u>Austritte BK Riemenstaldnerbach</u> Infolge Pensionierung im Frühjahr 2016 gibt Alois Rey den Austritt bekannt. KI Stefan Flury dankt ihm herzlich für die langjährige sehr angenehme Zusammenarbeit und überreicht ihm ein kleines Präsent. Xaver Schelbert vom Bezirk Schwyz schliesst sich dem Dank an und gibt sodann bekannt, dass er nächstes Jahr seine Tätigkeiten beim Bezirk abgibt. Ein kleines Geschenk wird nachgereicht. Die neuen Mitglieder für Alois Rey und Xaver Schelbert sind noch nicht bestimmt.</p> <p>9. Weiteres Vorgehen Keine Bemerkungen</p> <p>10. Termine Die nächste BK-Sitzung Nr. 28 ist am:</p> <p>Datum: Mittwoch 16. November 2016 Zeit: 14.00 bis 16.00 Uhr Ort: Amt für Tiefbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf Sitzungszimmer E2</p> <p>Altdorf, 30. November 2015 / AfT/WB/Du</p> <p>ABTEILUNG WASSERBAU</p>  Herbert Duss, Sekretär <ul style="list-style-type: none"> - Jahresprogramm und Jahresbudget 2016 - Pendenzenliste - Terminliste Dienstbarkeitsverträge mit Quelleneigentümern - Geschiebeentnahmen im Seebecken - Übersicht Massnahmenmodule | <p>AfT / AWB 16. Nov. 2016</p> |

Jahresprogramm und Jahresbudget 2016 vom 18. November 2015

Grundlage: Konkordat zwischen den Kantonen Uri und Schwyz, Massnahmenplan 1991 und Bau- und Auflageprojekt vom 15. Mai 2015
 Bundessubventionen (BAFU): 60%: voraussichtlicher Beitragsatz, Gesuch in Vorbereitung

Beiträge besonders bevorteilter Dritte: Nationalstrasse 3% der Kosten; SBB 19.5% der Restkosten gemäss risikobasiertem Kostenteilermodell, Verhandlungen werden demnächst gestartet.

| Massnahme | Bruttokosten exklusive Zinsen und Verwaltung | | Aufteilung brutto | | | | Beitrag National- strasse 3% von 1. | Subven- tionsbe- rechtigte Kosten 1.-6. | Bundes Subven- tionen 60% | Rest- kosten 1. - (6. + 8.) | Beiträge bbD 19.5% von 9. | Nettokosten | | |
|---|--|----|-------------------|-------------|----------|----------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|----|
| | SZ | UR | % | SZ | UR | Fr. | | | | | | exkl. Zinsen und Verwaltung | Anteil | |
| | | | | | | | | | | | | | | SZ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 75 | 25 | 3'750.0 | 1'250.0 | | 150.0 | 4'850.0 | 2'910.0 | 1'940.0 | 378.3 | 1'561.7 | 1'171.3 | 390.4 | |
| 3. Schluchtpartie Messungen und Messeinrichtungen Proj.-Nr. 696 (vor 1.1.2008 Pos. 418.22) | 5'000.0 | | | | | | | | | | | | | |
| Ausführung von Baumassnahmen auf der Grundlage des Bau- und Auflageprojektes vom Mai 2015 (Massnahme M7) Proj.-Nr. 693 | 300'000.0 | 50 | 150'000.0 | 150'000.0 | | 9'000.0 | 291'000.0 | 174'600.0 | 116'400.0 | 22'698.0 | 93'702.0 | 46'851.0 | 46'851.0 | |
| 4. Unterlauf Ausführung von Baumassnahmen auf der Grundlage des Bau- und Auflageprojektes vom Mai 2015 (Massnahmen M1-M3) Proj.-Nr. 691 | 1'150'000.0 | 25 | 203'500.0 | 946'500.0 | 24'420.0 | 24'420.0 | 789'580.0 | 473'748.0 | 315'832.0 | 61'587.2 | 254'244.8 | 63'561.2 | 526'683.6 | |
| | 814'000.0 | | | | | | Anteil subventionsberechtigter Kosten reduziert sich wegen der Kirchwegbrücke um Fr. 336'000.-, 70% von Fr. 480'000.- = Kosten Ersatzneubau | | | | | | | |
| | 1'455'000.0 | | 357'250.0 | 1'097'750.0 | 33'570.0 | 33'570.0 | | 651'258.0 | | 84'663.5 | | 111'583.5 | 573'925.0 | |

| |
|--|
| PENDENZENLISTE, Stand 18. November 2015 |
|--|


| <i>Protokoll Nr.</i> | <i>Aufträge</i> | <i>Termin / Wer</i> |
|----------------------|---|---|
| 19.7 / 24.5 | <p>Unterhaltsregelung</p> <p>Die Vereinbarung über den Unterhalt ist zu bereinigen. Zuwarten bis Revision Wasserrechtsgesetz abgeschlossen (s. Protokoll Nr. 27, Traktandum 2.2).</p> | 2017 AWB Schwyz Bezirk Schwyz |
| 19.9.1/ 24.3 | <p>Überwachungskonzept 'Rutschungen' / Rutschung Binzenegg</p> <p>Jährlicher Kontrollgang mit Einbezug von Daniel Bollinger, Kantonsforstamt Schwyz, Fachbereich Naturgefahren. An der Sitzung vom 18. November 2015 wurde beschlossen, die Kontrollgänge beizubehalten (wegen Sekundärprozessen und nach Bedarf).</p> | Frühjahr 2016 AFT Uri / WB / Du KFA Schwyz / Bo |
| 27.3 | <p>Die aufgelaufenen Kosten für die Überwachung der Rutschung Binzenegg sind per Ende 2015 abzurechnen. Danach erfolgt die Abrechnung über das Grundangebot (neue Pos.-Nr. eröffnen).</p> | Dezember 2015 AFT |
| 27.6 | <p>Jahresprogramm und Jahresbudget 2015</p> <p>Die Regierungsanträge sind vorzubereiten und durch die Kantone Schwyz und Uri genehmigen zu lassen.</p> | 15. Dez. 2015 AFT Uri / AWB Schwyz |
| 27.8 | <p>Die Gefahrenkarte nach Umsetzung der Massnahmen ist im Dossier Subventionsgesuch BAFU enthalten und wird an der Sitzung vom 26. November 2015 der Kommission Naturgefahren behandelt.</p> | 26. Nov. 2015 AFT / L.Eggimann AFJ |
| 27.8 | <p>Die Nutzungsverträge der Quellen sind zu verlängern (s. Beilage Terminliste Dienstbarkeitsverträge mit Quelleigentümern).</p> | 16. Nov. 2016 AWB Schwyz AFT Uri / WB / Du |

Altdorf, 30. November 2015, AFT/WB/Du


Baukommission Riemenstaldnerbach
Verzeichnis der Quellenrechte / Dienstbarkeitsverträge mit Quelleneigentümern

| Vertragsteilnehmer 1 | Vertragsteilnehmer 2 | Vertragsteilnehmer 3 | Betroffene Quellen | Beginn Vertrag | Auslauf Vertrag |
|--|---|------------------------------|--|----------------|-----------------|
| Gemeinde Riemenstalden | Kanton Uri; Kanton Schwyz | / | Brunnenstube 5; Quellfassung 5 | 07.09.2007 | 06.09.2017 |
| Paul Inderbitzin, Schulhausstrasse 1, 6438 Ibach | Kanton Uri; Kanton Schwyz | / | Quellfassung 7; Quellfassung 8 | 07.09.2007 | 06.09.2017 |
| Markus Inderbitzin- Suter, Loosberg, 6452 Riemenstalden | Kanton Uri; Kanton Schwyz | / | Quellfassungen 1-4 | 07.09.2007 | 06.09.2017 |
| Markus Inderbitzin- Suter, Loosberg, 6452 Riemenstalden | Wasser- / Kanalisationskommis- sion Sisikon 6452 Sisikon | Kanton Uri; Kanton Schwyz | Quellfassung Hangquelle Ägerli; Brunnenstube NBR Ø 150cm; Wasserleitung PE Ø 150mm | 28.01.2003 | 27.01.2023 |

Geschiebesammler Riemenstaldnerbach, Räumung Sommer 2015 ca. 3'400 m³

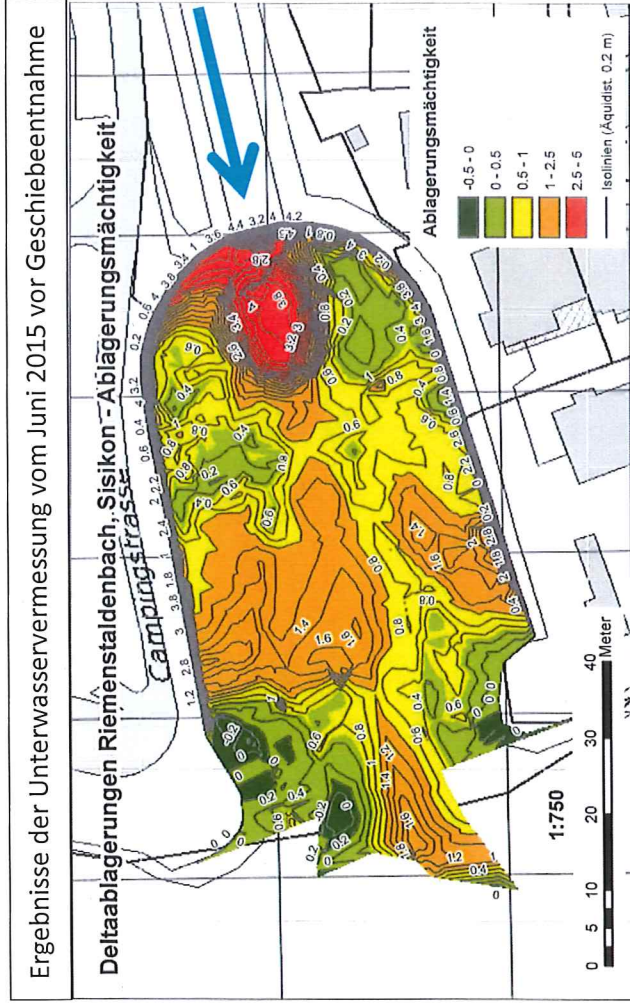

Grafische Darstellung der Geschiebeentnahmen 2000 - 2015

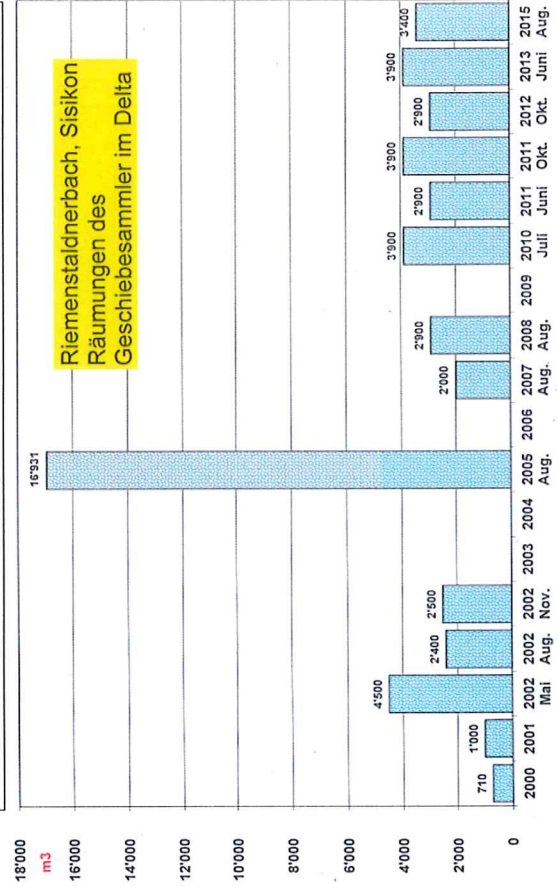

Geschiebeentnahme Sommer 2015



18.11.2015, AFT/WB/Du

Amt für Tiefbau, Abteilung Wasserbau
Hochwasserschutz Riemenstaldnerbach
Übersicht Massnahmenmodule
5. Nov. 2015

