

PROTOKOLL NR. 28

Betrifft: Baukommission Riemenstaldnerbach
Konkordat Uri / Schwyz
Datum: 16. November 2016, 14:00 - 16:15 Uhr
Ort: Amt für Tiefbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf

Teilnehmer:

KANTON SCHWYZ

D. Kassubek, Kantonsingenieur, Tiefbauamt Kt. Schwyz, Postfach 1251, 6431 Schwyz (Vizepräs. BK)
C. Bommer, Umweltdepartement, Amt für Wasserbau, Postfach 1214, 6431 Schwyz

Bezirk Schwyz

D. Horat, Bezirksrat / Gewässerpräsident Bezirk Schwyz, Husmatt 1, 6424 Lauerz

KANTON URI

Amt für Tiefbau

S. Flury, Kantonsingenieur, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf (Präs. BK)
E. Philipp, Abt. Wasserbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf
H. Duss, Abt. Wasserbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf (Protokoll)

Gemeinde Riemenstalden

M. Gisler, Gemeindepräsident, Rosslau 2, 6452 Riemenstalden
W. Gisler, Dörfli 7, 6452 Riemenstalden (Mitglied BK neu, Nachfolger von M. Gisler)

Entschuldigt:

K. von Euw, Bezirk Schwyz, Gewässerkommission, Rathaus, 6430 Schwyz
B. Fischlin, Am See 5, 6452 Sisikon (Vertreter der Gemeinde Sisikon)

Verteiler:

Teilnehmer / Entschuldigte

Gemeinderat Sisikon, 6452 Sisikon
Gemeinderat Morschach, 6443 Morschach
G. Schuler, Tiefbauamt Kanton Schwyz, Abt. Abteilung Realisierung, Postfach 1251, 6431 Schwyz
J. Gabriel, Amt für Wald und Naturgefahren, Bahnhofstrasse 9, Postfach 1184, 6431 Schwyz
B. Annen, Amt für Forst und Jagd, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf
F. Epp, Leiter Gewässerunterhalt, Amt für Tiefbau Kt. Uri, Abt. Wasserbau, Klausenstr. 2, 6460 Altdorf

Traktanden:

1. Protokollgenehmigung (Protokoll Nr. 27)
2. Informationen
3. Rutschung Binzenegg
4. Bauprojekt Hochwasserschutz Riemenstaldnerbach
5. Studie Hochwasserschutz Riemenstaldnerbach
6. Jahresprogramm und Jahresbudget 2017
7. Verschiedenes
8. Weiteres Vorgehen
9. Termine


Abkürzungen

BK	Baukommission Riemenstaldnerbach
AWB	Umweltdepartement Schwyz, Amt für Wasserbau
AWN	Amt für Wald und Naturgefahren (Kanton Schwyz)
BD	Baudirektion / Baudepartement
AfT	Amt für Tiefbau (Kanton Uri)
AFJ	Amt für Forst und Jagd (Kanton Uri)
ARE	Amt für Raumentwicklung (Kanton Uri)
BAFU	Bundesamt für Umwelt, Bern
IB	Interessenbeitrag
HWS	Hochwasserschutz
bbD	besonders bevorteilte Dritte
KBG	Korporationsbürgergemeinde
GIS	Geographisches Informationssystem
TK HWS	Technische Kommission Hochwasserschutz

	Erledigung Wer / Termine
<p>1. Protokollgenehmigung (Protokoll Nr. 27)</p> <p>Das Protokoll Nr. 27 der BK- Sitzung vom 18. November 2015 wird verdankt und genehmigt.</p> <p>Pendenzenliste Die Pendenzenliste wurde aktualisiert (s. Beilage).</p> <p>2. Information</p> <p>2.1 Wasserrechtsgesetz SZ und Gewässerunterhalt Christian Bommer informiert über den Stand der Arbeiten. Die Totalrevision des Wasserrechtsgesetzes ist im Gange und dauert länger als ursprünglich angenommen. Die Abschaffung der Wuhrkorporationen ist umstritten. Der Terminplan sieht wie folgt aus:</p>	

	Erledigung Wer / Termine
<p>- 2016: Vernehmlassung und Auswertung bis Ende 2016 - 2017: Kantonsrat - 2018, ev. 2019: Inkraftsetzung Mit dem neuen Wasserrechtsgesetz wäre dann der Unterhalt geregelt und damit würden dafür keine separaten Vereinbarungen benötigt.</p> <p>2.2 Kostenteilerverhandlungen bbD Ernst Philipp informiert über den Stand der Kostenteilerverhandlungen im Kanton Uri. Das BAFU erarbeitete ein risikobasiertes Modell mit einem risikobasierten Anteil und einem Werkeigentümergepflichtanteil. Neu ist, dass jedes einzelne Projekt verhandelt werden muss. Die Kostenteilerverhandlungen für das Bauprojekt Riemenstaldnerbach konnten am 7. März 2016 abgeschlossen werden. Die vereinbarten Ansätze sind in der Tabelle des Jahresbudgets 2017 ersichtlich. Sodann konnten auch die Kostenteilerverhandlungen zum Gewässerunterhalt abgeschlossen werden. Beim Riemenstaldnerbach beteiligt sich die Nationalstrasse an den Gesamtkosten mit 15% und an den Restkosten beteiligt sich die SBB mit 30%, dies aber nur an den Kosten des Kantons Uri.</p> <p>3. Rutschung Binzenegg (Messergebnisse, Fortsetzung der Überwachung) Die Überwachung der Rutschung Binzenegg erfolgt einmal jährlich durch die Firma Flotron. Die Messung Nr. 16 wurde am 4. Mai 2016 durchgeführt. Es wurden keine signifikanten Verschiebungen festgestellt. Die nächste Messung erfolgt im Frühjahr 2017. Die Kosten für die Überwachung der Rutschung Binzenegg werden mit dem BAFU über das Grundangebot abgerechnet.</p> <p>4. Bauprojekt Hochwasserschutz Riemenstaldnerbach Die Bauarbeiten konnten gemäss Terminplan im Frühjahr 2016 gestartet werden. Im Abschnitt der Schluchtstrecke, Massnahmen M6 (Binzenegg) und M7 (Rutschung Rüti), konnten die Bauarbeiten mit Ausnahme der Pflanzungen und der Pflege bereits Mitte November 2016 abgeschlossen werden. Gegenüber dem KV ergibt sich eine Kostenreduktion von rund Fr. 200'000.-. Im Abschnitt 'Dorf Sisikon' wurden das Schutzblech bei der SBB-Brücke montiert (M1a) und im Bachbereich der Ägerliquellen (M5) die Sanierungsarbeiten ausgeführt. Sodann wurden Mitte Oktober 2016 die Bauarbeiten 'Ersatz Brücke Kirchenweg inkl. Überlast (M2) gestartet. Im Dezember 2016 ist die Ausführung des Schutzbleches bei der Dammstrasse (M1b) terminiert. Im kommenden Jahr erfolgen die Abschlussarbeiten an der neuen Brücke Kirchenweg. Sodann werden mit Ausnahme der Massnahmen auf den Bahngleisen (Überlastfall Brücke SBB) die restlichen Massnahmenmodule ausgeführt. Die Umsetzung des Massnahmenmoduls 'Überlastfall Brücke SBB' wird die SBB voraussichtlich im Jahr 2018 ausführen.</p>	<p>AWN / D. Bollinger Frühjahr 2017</p>

	Erledigung Wer / Termine								
<p>5. Studie Hochwasserschutz Riemenstaldnerbach</p> <p>An der Sitzung vom 24. August 2016 im Zusammenhang mit den besonders bevorteilten Dritten machte die SBB darauf aufmerksam, dass die SBB-Linie auf ein hundertjähriges Ereignis geschützt sein sollte. Im Rahmen des Bau- und Auflageprojektes am 29. April 2015 wurde dies mit Vertretern der SBB bereits besprochen. Der Wunsch nach einer Abklärung auf Stufe Studie wurde vom Amt für Tiefbau des Kantons Uri aufgenommen und der SBB wurde mitgeteilt, dass dieses Thema an der nächsten Sitzung der Baukommission Riemenstaldnerbach traktandiert wird.</p> <p>Mit Schreiben vom 26. Oktober 2016 gelangte die SBB schriftlich an die Baudirektion Uri. Die Anfrage ist, ob die SBB eine finanzielle Beteiligung des Kantons für die Erarbeitung der Studie erwarten kann. Seitens des Bundes wurde eine finanzielle Beteiligung in Aussicht gestellt.</p> <p>An der Sitzung wurde der Nutzen der Studie von einzelnen Teilnehmern stark in Frage gestellt. KI Stefan Flury machte den Antrag die Studie mit einem Pauschalbetrag von Fr. 5'000.- zu unterstützen und den Betrag auf der Grundlage des Konkordats 75% Kt. Uri (Fr. 3'750.-) und 25% Kt. Schwyz (Fr. 1'250.-) aufzuteilen.</p> <p>Die Abstimmung über diesen Antrag ergab ein Stimmverhältnis 3:3. Die Vereinbarung für das Konkordat Riemenstaldnerbach sieht für ein unentschiedenes Abstimmungsresultat den Weiterzug an die beiden Regierungsräte UR und SZ vor. Angesichts des kleinen Betrages wird auf diesen Schritt verzichtet.</p> <p>KI Stefan Flury entscheidet, dass der Kanton Uri seinen Beitrag im Sinne einer solidarischen Aufgabe leistet. Der Kanton Schwyz beteiligt sich nicht.</p> <p>Beschluss:</p> <p>Der Entscheid der Baukommission Riemenstaldnerbach ist der SBB schriftlich mitzuteilen</p>	<p>AfT Dezember 2016</p>								
<p>6. Jahresprogramm und Jahresbudget 2017</p> <p>Im kommenden Jahr erfolgen die Abschlussarbeiten an der neuen Brücke Kirchenweg inkl. Überlastfall. Sodann werden mit Ausnahme der Massnahmen auf den Bahngleisen, Überlastfall Brücke SBB, die restlichen Massnahmenmodule (s. Kap.4) ausgeführt.</p> <p>Das Budget 2017 setzt sich wie folgt zusammen:</p> <table data-bbox="295 1736 1204 1870"> <tr> <td>- Rutschüberwachung Binzenegg:</td> <td>Fr. 5'000.-</td> </tr> <tr> <td>- Schluchtstrecke: Fertigstellungsarbeiten</td> <td>Fr. 20'000.-</td> </tr> <tr> <td>- Dorf Sisikon: M1-M3 ohne Überlastfall Brücke SBB</td> <td>Fr. 725'000.-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>Fr. 750'000.-</td> </tr> </table> <p>Beschluss:</p> <p>Das Jahresbudget 2017 (s. Beilage) wird durch die BK-Mitglieder einstimmig genehmigt und ist den Regierungen Uri und Schwyz gleichzeitig zur Genehmigung einzureichen.</p>	- Rutschüberwachung Binzenegg:	Fr. 5'000.-	- Schluchtstrecke: Fertigstellungsarbeiten	Fr. 20'000.-	- Dorf Sisikon: M1-M3 ohne Überlastfall Brücke SBB	Fr. 725'000.-	Total	Fr. 750'000.-	<p>AfT / AWB Dezember 2016</p>
- Rutschüberwachung Binzenegg:	Fr. 5'000.-								
- Schluchtstrecke: Fertigstellungsarbeiten	Fr. 20'000.-								
- Dorf Sisikon: M1-M3 ohne Überlastfall Brücke SBB	Fr. 725'000.-								
Total	Fr. 750'000.-								

	Erledigung Wer / Termine ^s
<p>7. Verschiedenes</p> <p><u>Nutzungsverträge der Quellen</u> An der letzten BK-Sitzung vom 18. November 2015 wurde beschlossen die Nutzungsverträge für die Quellen, welche am 06. September 2017 auslaufen, der Projektorganisation Axen (Kanton SZ und UR) zu übertragen. Paul Gerber, Projektleiter Neue Axenstrasse hat dies in seiner Pendenzenliste. Für das HWS-Programm Riemenstaldnerbach ist dieses Thema erledigt. KI Daniel Kassubek erkundigt sich bei Paul Gerber über den Stand der Arbeit.</p> <p><u>Rutschüberwachung Binzenegg</u> Daniel Horat stellt die Frage betreff der finanziellen Einbindung der Gemeinden im Zusammenhang mit der Rutschüberwachung Binzenegg. Ernst Philipp erklärt, dass in Uri der Kanton diese Aufgaben zusammen mit dem Bund wahrnimmt (Gefahregrundlagen). Die Rutschung Binzenegg befindet sich innerhalb des Perimeters des Riemenstaldnerbachs und hat eine direkte Auswirkung auf das Dorf Sisikon sowie die Riemenstaldnerstrasse.</p> <p><u>Verabschiedung Martin Gisler</u> Martin Gisler, Gemeindepräsident von Riemenstaldnerbach teilt mit, dass er sein Mandat in der BK Riemenstaldnerbach Wilhelm Gisler übergibt. Wilhelm Gisler ist Gemeinderat von Riemenstalden. KI Stefan Flury dankt Martin Gisler für seinen Einsatz während der letzten Jahre.</p> <p>8. Weiteres Vorgehen Keine Bemerkungen</p> <p>9. Termine Die nächste BK-Sitzung Nr. 29 ist am:</p> <p>Datum: Dienstag 21. November 2017 Zeit: 14.00 bis 16.00 Uhr Ort: Amt für Tiefbau, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf Sitzungszimmer E2</p> <p>Altdorf, 23. November 2016 / AFT/WB/Du</p> <p>ABTEILUNG WASSERBAU</p> <p> Herbert Duss, Sekretär</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jahresprogramm und Jahresbudget 2017 - Pendenzenliste - Terminliste Dienstbarkeitsverträge mit Quelleneigentümern - Übersicht Massnahmenmodule 	<p>KI Schwyz / D. Kassubek</p>

Jahresprogramm und Jahresbudget 2017 vom 16. November 2016

Grundlage: Konkordat zwischen den Kantonen Uri und Schwyz, Massnahmenplan 1991 und Bau- und Auflageprojekt vom 15. Mai 2015

Bundessubventionen (BAFU): 54.7% für Massnahmen der Subventionsverfügung Nr. 201 und 50 % für Gefahregrundlagen (GG) der Rutschüberwachung Binzenegg

Beiträge besonders bevorzelter Dritte: Nationalstrasse 3% der Kosten; SBB 20% der Restkosten gemäss risikobasiertem Kostenteilermodell

Massnahme	Bruttokosten exklusive Zinsen und Verwaltung		Aufteilung brutto						Beitrag National- strasse von 1. 6	Subven- tions- rechti- ge Kosten 1.-6.	Bundes Subven- tionen	Rest- kosten 1.- (6. + 8.) 9	Beiträge bbD von 9. 10	Nettokosten	
			%			Fr.								exkl. Zinsen und Verwaltung	Anteil
			SZ	UR	3	SZ	UR	5							
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
3. Schluchtpartie															
Rutschüberwachung Binzenegg, Proj.-Nr. 1'688 (bis 31.12.2015 Pos. 696)	5'000.0	75	25	3'750.0	1'250.0			0.0	5'000.0	2'500.0	2'500.0	0.0	2'500.0	1'875.0	625.0
Pflanz- und Pflegearbeiten auf der Grundlage des Bau- und Auflage- projektes vom Mai 2015 (Massnahme M6 und M7), Proj.-Nr. 1'620	20'000.0	50	50	10'000.0	10'000.0			600.0	19'400.0	10'611.8	8'788.2	1'757.6	7'030.6	3'515.3	3'515.3
4. Unterlauf (Dorf Sisikon)															
Ausführung von Baumassnahmen auf der Grundlage des Bau- und Auflageprojektes vom Mai 2015 (Massnahmen M1-M3 exkl. Überlast Brücke SBB, Ausführung 2018), Proj.-Nr. 1'619 und 1'705	725'000.0	25	75	181'250.0	543'750.0			21'750.0	703'250.0	384'677.8	318'572.3	63'714.5	254'857.8	63'714.5	191'143.4
	750'000.0			195'000.0	555'000.0			22'350.0		397'789.6		65'472.1		69'104.7	195'283.6

PENDENZENLISTE, Stand 16. November 2016
--


<i>Protokoll Nr.</i>	<i>Aufträge</i>	<i>Termin / Wer</i>
19.7 / 24.5	<p>Unterhaltsregelung</p> <p>Die Vereinbarung über den Unterhalt ist zu bereinigen. Zuwarten bis Revision Wasserrechtsgesetz abgeschlossen (s. Protokoll Nr. 28, Traktandum 2.1).</p>	2018 AWB Schwyz Bezirk Schwyz
19.9.1/ 24.3	<p>Überwachungskonzept 'Rutschungen' / Rutschung Binzenegg</p> <p>Jährlicher Kontrollgang mit Einbezug von Daniel Bollinger, Kantonsforstamt Schwyz, Fachbereich Naturgefahren. An der Sitzung vom 18. November 2015 wurde beschlossen, die Kontrollgänge beizubehalten (wegen Sekundärprozessen und nach Bedarf).</p>	Frühjahr 2017 Aft Uri / WB / Du KFA Schwyz / Bo
28.6	<p>Jahresprogramm und Jahresbudget 2017</p> <p>Die Regierungsanträge sind vorzubereiten und durch die Kantone Schwyz und Uri genehmigen zu lassen.</p>	13. Dez. 2016 Aft Uri / AWB Schwyz
27.8	<p>Die Nutzungsverträge der Quellen sind zu verlängern (s. Beilage Terminliste Dienstbarkeitsverträge mit Quelleigentümern).</p>	Winter 2016/2017 P. Gerber, PL Neue Axenstrasse

Altdorf, 23. November 2016, Aft/WB/Du

Baukommission Riemenstaldnerbach
Verzeichnis der Quellenrechte / Dienstbarkeitsverträge mit Quelleneigentümern

Vertragsteilnehmer 1	Vertragsteilnehmer 2	Vertragsteilnehmer 3	Betroffene Quellen	Beginn Vertrag	Auslauf Vertrag
Gemeinde Riemenstalden	Kanton Uri; Kanton Schwyz	/	Brunnenstube 5; Quellfassung 5	07.09.2007	06.09.2017
Paul Inderbitzin, Schulhausstrasse 1, 6438 Ibach	Kanton Uri; Kanton Schwyz	/	Quellfassung 7; Quellfassung 8	07.09.2007	06.09.2017
Markus Inderbitzin-Suter, Loosberg, 6452 Riemenstalden	Kanton Uri; Kanton Schwyz	/	Quellfassungen 1-4	07.09.2007	06.09.2017
Markus Inderbitzin-Suter, Loosberg, 6452 Riemenstalden	Wasser- / Kanalisationskommission Sisikon 6452 Sisikon	Kanton Uri; Kanton Schwyz	Quellfassung Hangquelle Ägerli; Brunnenstube NBR Ø 150cm; Wasserleitung PE Ø 150mm	28.01.2003	27.01.2023

Amt für Tiefbau, Abteilung Wasserbau
Hochwasserschutz Riemensalderbach
Übersicht Massnahmenmodule
5. Nov. 2015

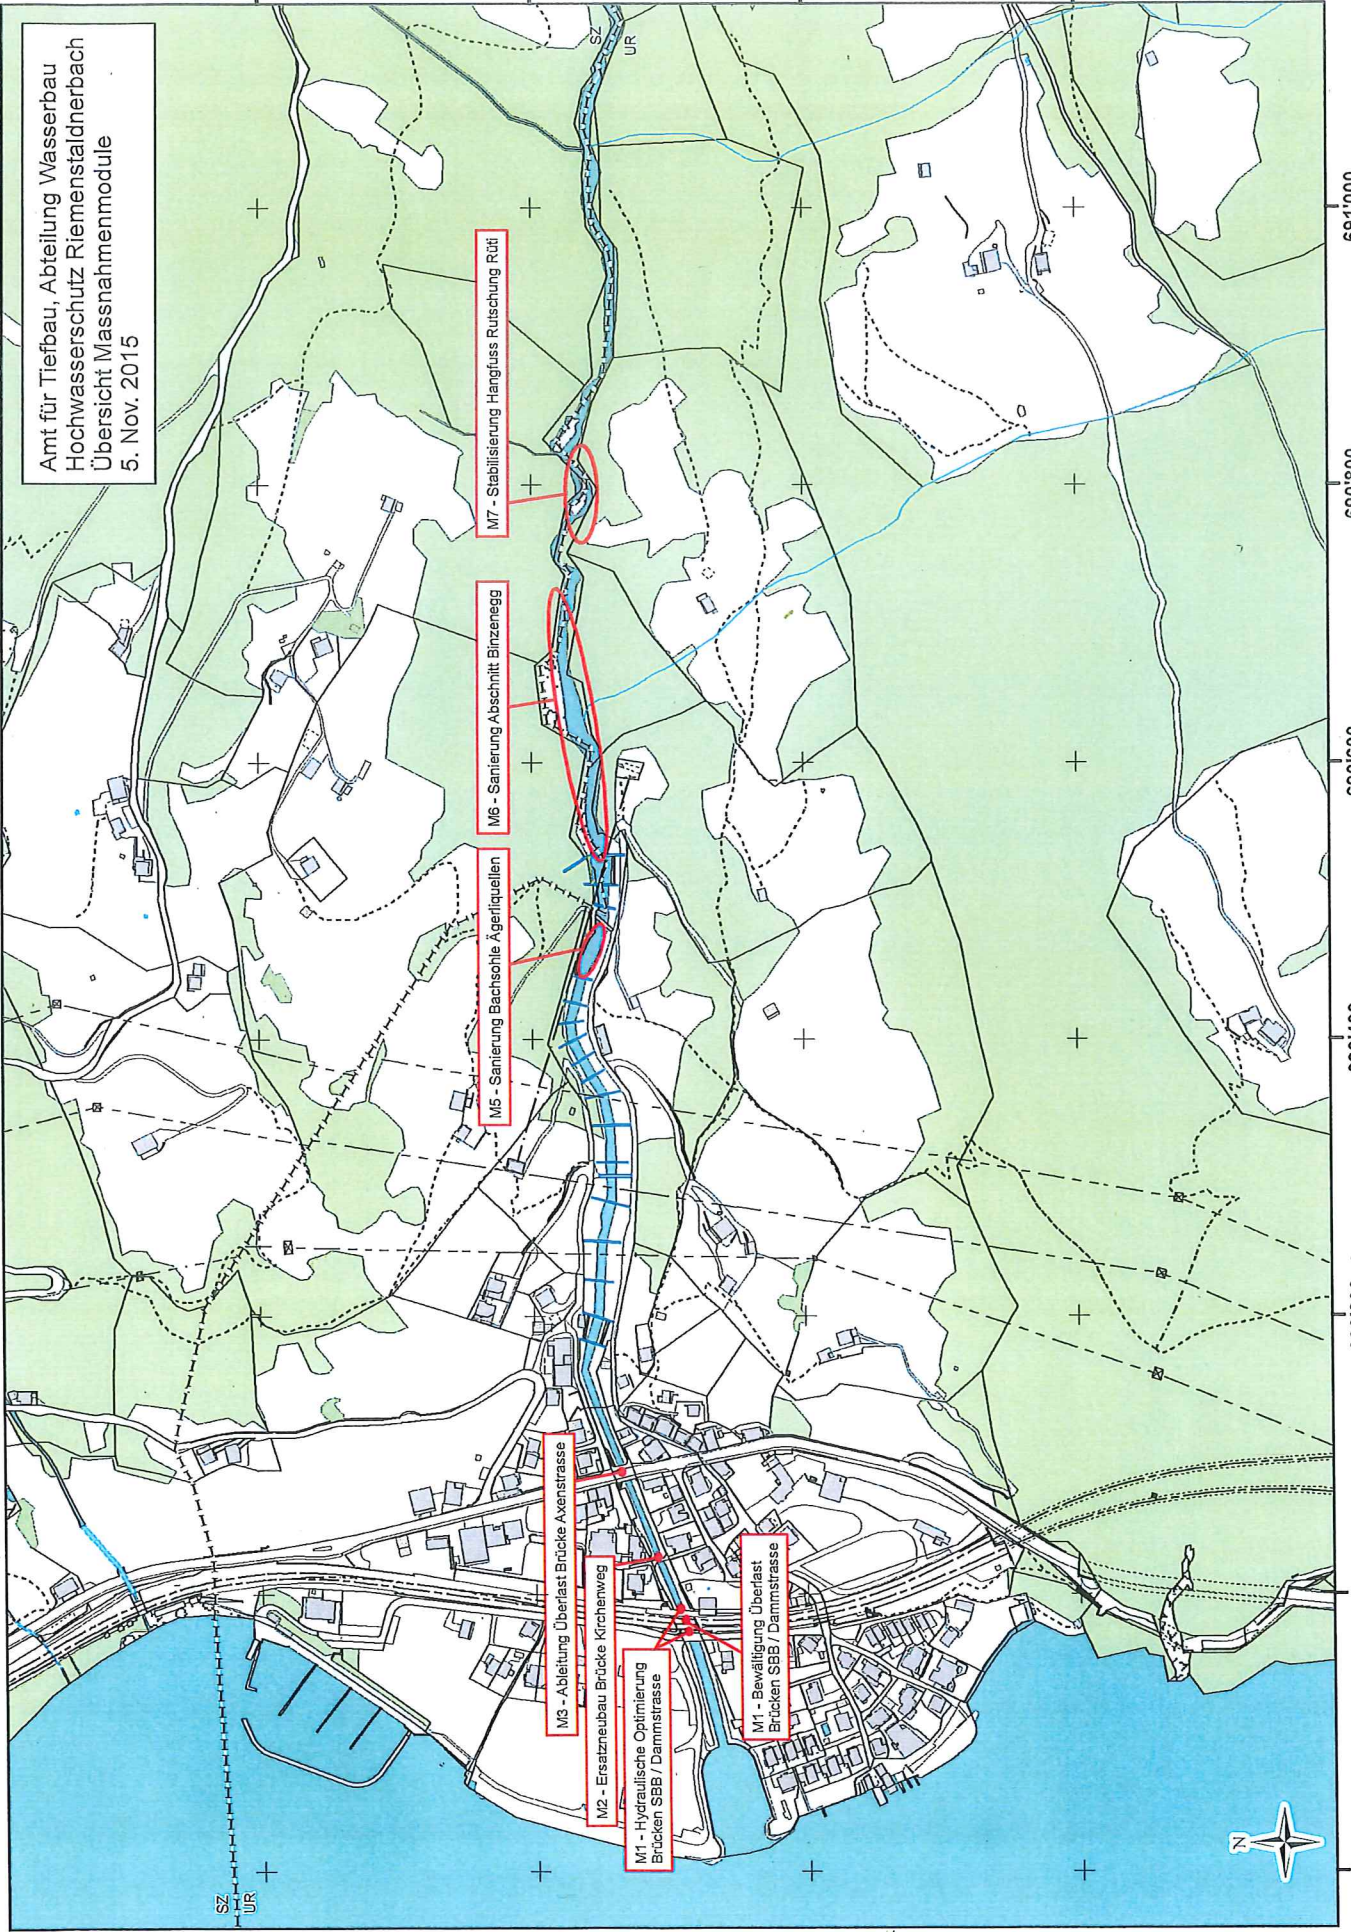

M7 - Stabilisierung Hangfluss Rutschung Rütli

M6 - Sanierung Abschnitt Binzenegg

M5 - Sanierung Bachsohle Agerliquellen

M3 - Ableitung Überlast Brücke Axenstrasse

M2 - Ersatzneubau Brücke Kirchenweg

M1 - Hydraulische Optimierung
Brücken SBB / Dammstrasse

M1 - Bewältigung Überlast
Brücken SBB / Dammstrasse

200'800 200'600 200'400 200'200

691'000 690'800 690'600 690'400 690'200 690'000

